

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE:

Edelevalle 42
6610 Middelkerke

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW nr.:

0538 775 810

- ☐ BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- ☐ BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- ☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- ☐ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- ☒ BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN:

Teller nr.:

Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 8/12/14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Zonnepanelen

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning: 230V V

Bescherming van de aansluiting: 25 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type: 40/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 10 Ohm; RI tot 20 Ohm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

In 2e leidendraad

Formule: $230V \times 25A \times 10 = 7,14kWh$
 Pmax: 6500 Wmax
 I: 14,1 A
 GST: no 7E36840000100
 Mod M 14 123

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

ge

Klasse B - 33 kWh

**PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK**

Notitie: - geen ps-laternieting wegens effectiviteit.
 Enkel uitbreiding naar zonnepanelen werd nagezien.
 Kortsluitwisch tussen panelen en omvormer werd niet nagezien.

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.


De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,

PRINCIPESCHMA NETGEKOPPELD PV-SYSTEEM

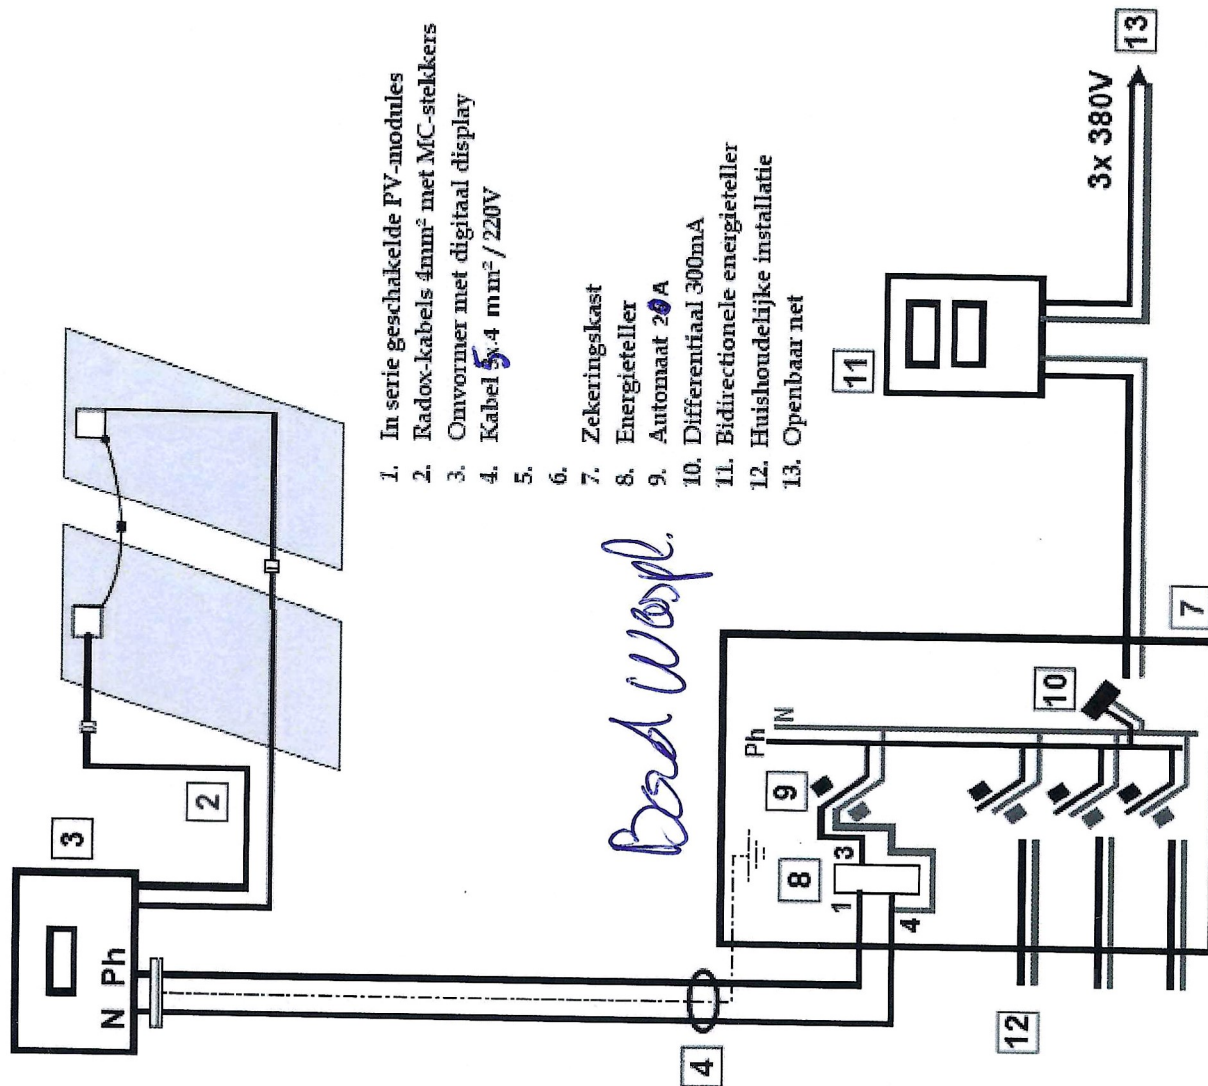

Klant : Verlanghe Hedwig
 Adres : Tolenvallestraat 412
 8660 Handzame

Installatie :
 28 panelen x 255Wp = 7,14 kWp

Omvormer :
 S Nr 25443410 120V-2
 P max ac 6500 Wmax
 I ac 14,1 A

SOENEN ZDR
 Zonne-energie
 Zink-, dak- en renovatiewerken
 Frederik Soenen
 Soetestraat 32 - 8840 Staden
 frederiksoenen@hotmail.com
 0473/46 12 66 BE 0538 775 810

Groenestroomteller :
 S Nr 7E3C840000100
 Mid MW 1259
 Klasse : B

Keuringsbureau BTW Staden
 Lefevere Yannick ;
 8.12 / 2014
