

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 161966

Datum keuring: 23/10/2018 Inspecteur: Jurgen Goethals Mentor: Installateur: CBE BVBA

ID-label: B.T.W. nr.: BE 818 002 852 IK. nr.: -

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 2577017

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Stationsdreef
Huisnummer 148 6b
Postcode 8800
Gemeente Roeselare
Type woning

Eigenaar:

Naam -
Straatnaam Stationsdreef
Huisnummer 148 6b
Postcode 8800
Gemeente Roeselare

EAN : 54

Teller Nr.: -

Aard onderzoek: Overdracht van eigendom van een huishoudelijke installatie van voor 1981 op vraag van de verkoper volgens AREI artikels 276bis, 278 en 86.

Netbeheerder: Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 9 Isolatie: 5 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 0.28 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
7	C	20		2	2,5
2	C	16		2	1,5
-	-	-		-	-

Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	☐
Equipotentiale verbindingen	☐ OK ☐ NOK ☒ niet van toepassing ☐ in afwachting				
Continuïteit	☐ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☐ OK ☐ NOK ☒ NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 23/10/2043
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 0

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jurgen Goethals

Goethals Jurgen

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 23/10/2043	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

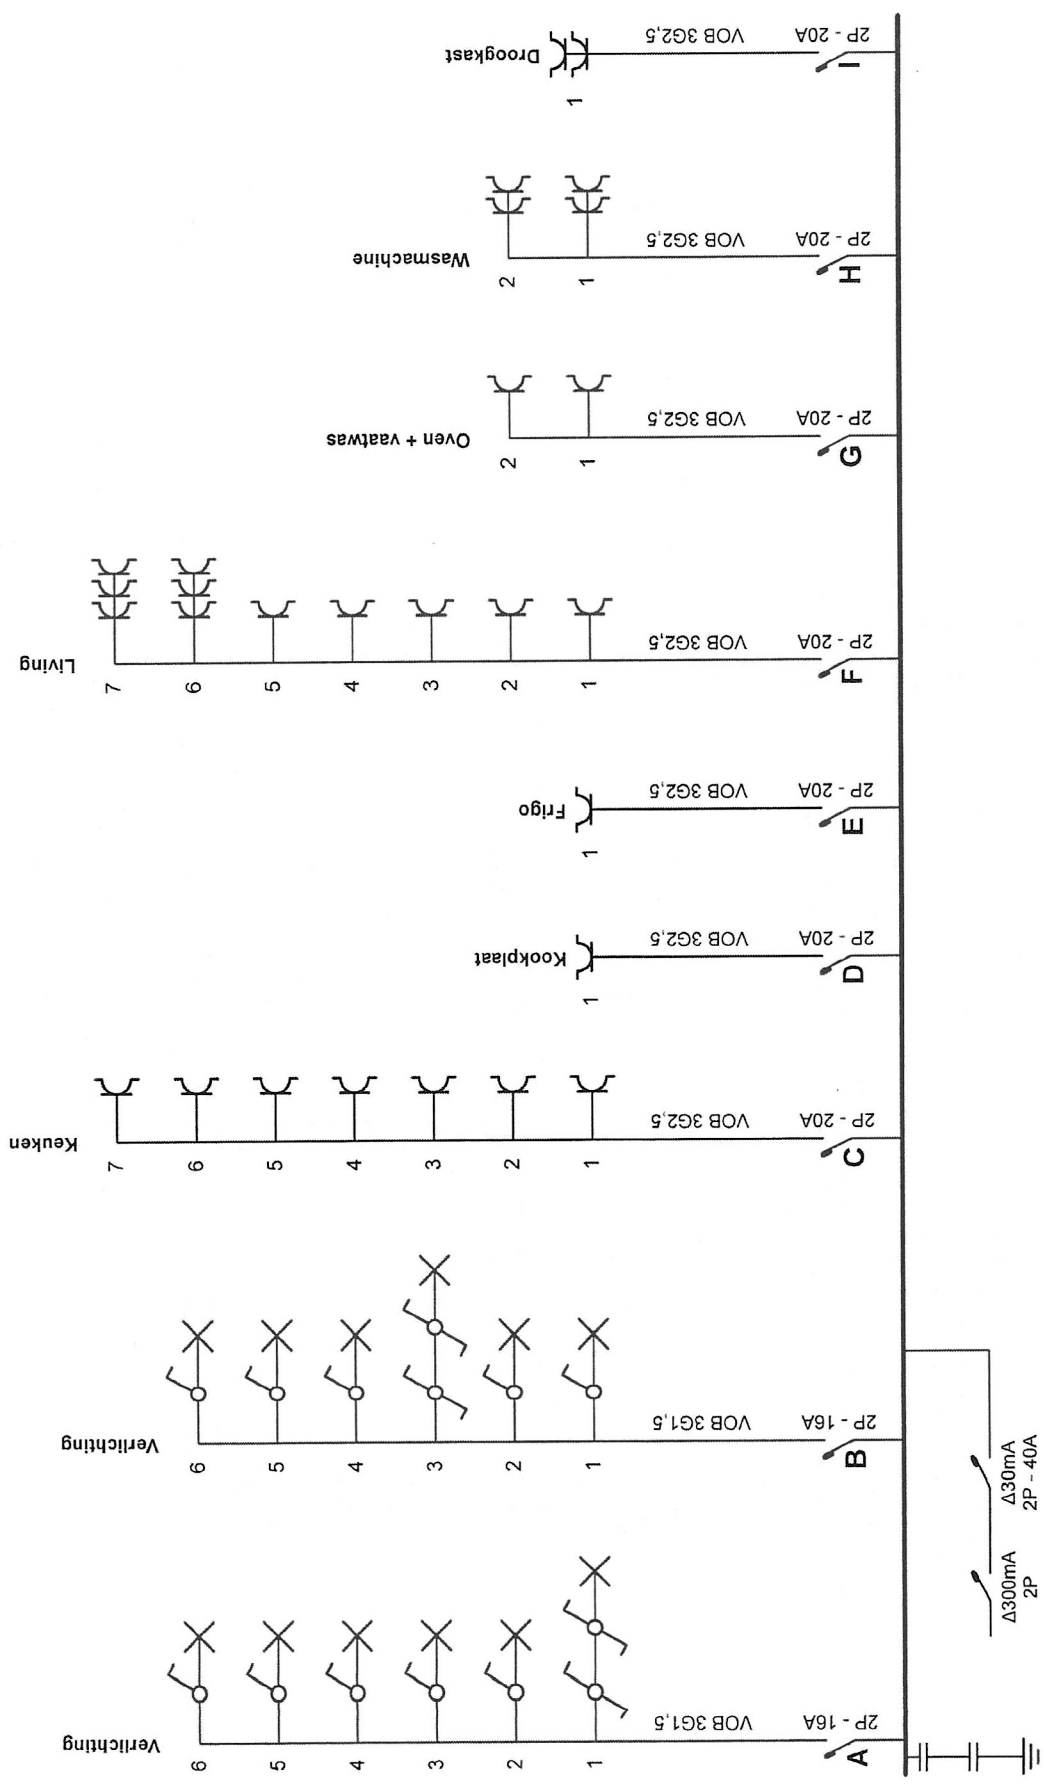

Plaats van de elektrische installatie
 Eva Carlier
 Stationsdreef 148 Bus 6b
 8800 Roeselare

Installateur
 CBE B.V.B.A.
 Kouterweg 64
 8890 Moorslede
 Tel.: 051 62 87 64
 Fax: 051 62 88 21
 e-mail: info@cb-e.be
 BTW BE 0818.002.582

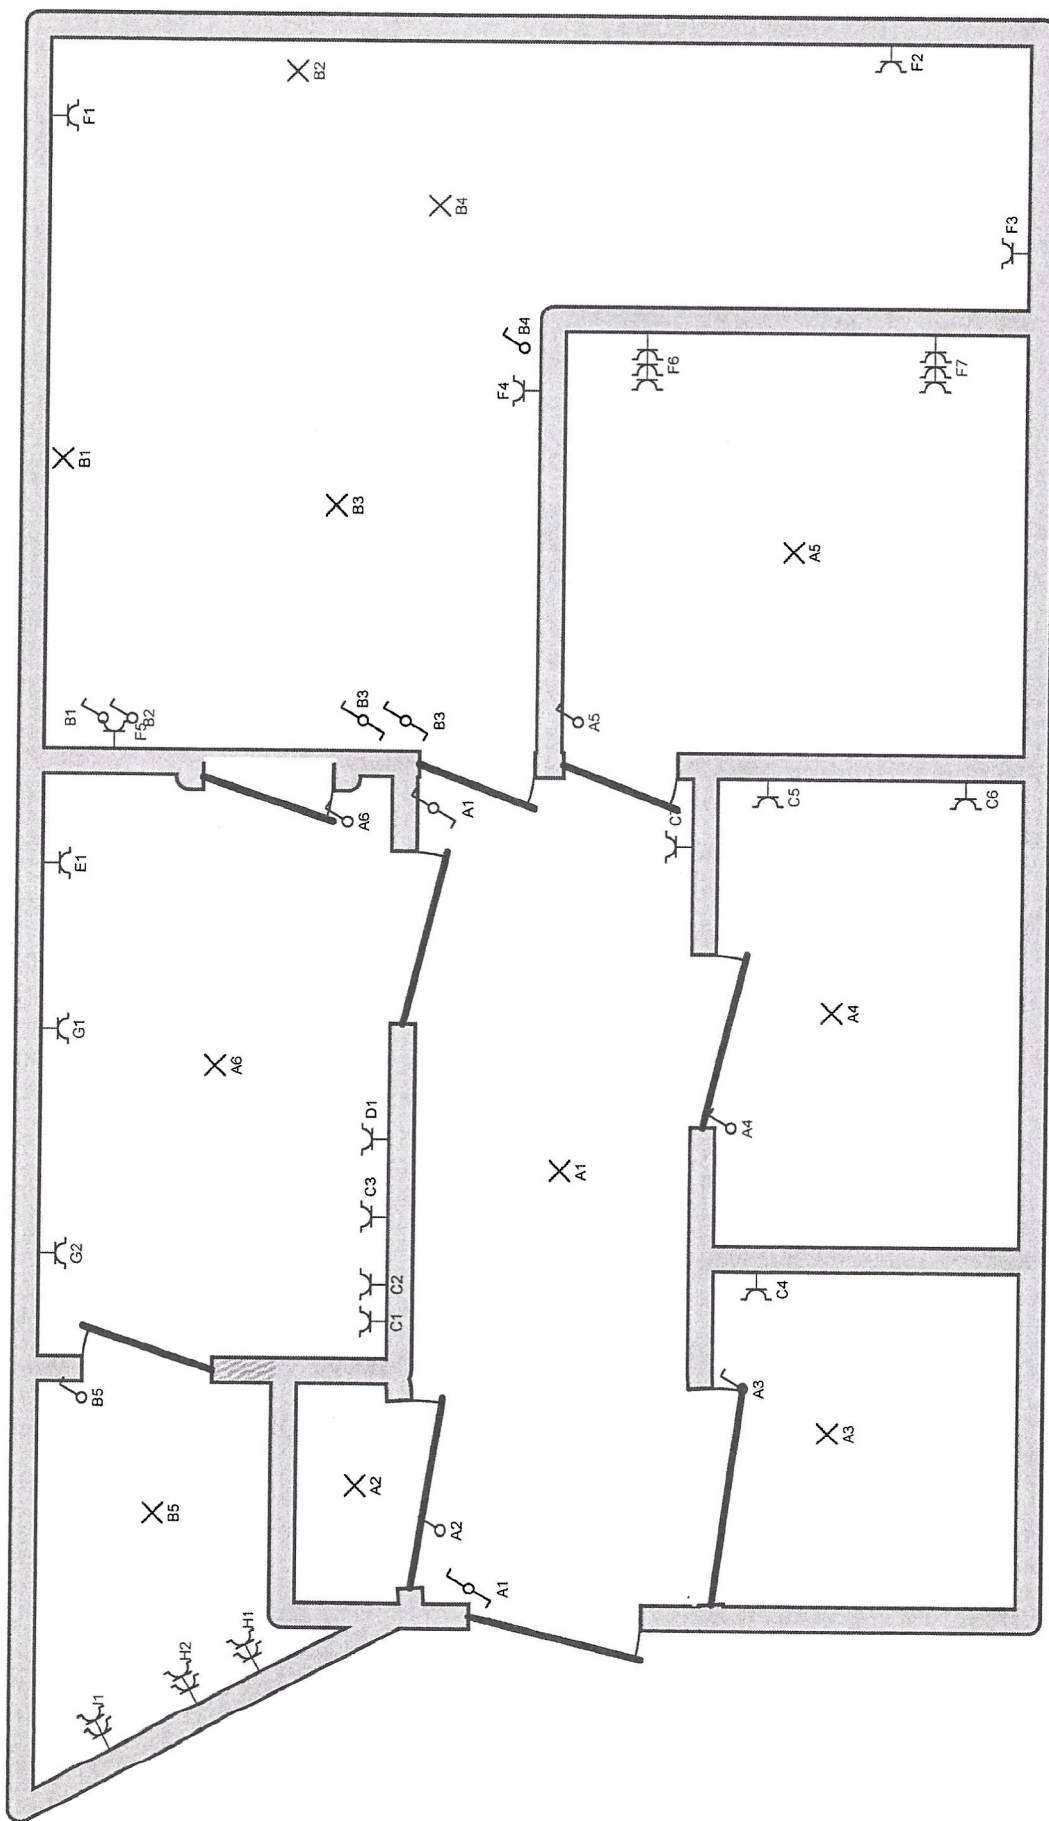

Plaats van de elektrische installatie
 Eva Carlier
 Stationsdreef 148 Bus 6b
 8800 Roeselare

Installateur
 CBE B.V.B.A.
 Kouterweg 64
 8890 Moorslede
 Tel.: 051 62 87 64
 Fax: 051 62 88 21
 e-mail: info@cb-e.be
 BTW BE 0818.002.582

p. 2/3
Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz

A Verlichting

B Verlichting

C Keuken

D Kookplaat

E Frigo

F Living

G Oven + vaatwas

H Wasmachine

I Droogkast

Plaats van de elektrische installatie
Eva Carlier
Stationsdreef 148 Bus 6b
8800 Roeselare

Installateur
CBE B.V.B.A.
Kouterweg 64
8890 Moorslede
Tel.: 051 62 87 64
Fax: 051 62 88 21
e-mail: info@cb-e.be
BTW BE 0818.002.582

p. 3/3
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz



